



HELSE MØRE OG ROMSDAL

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal


Status i SNR-prosjektet

Styremøte i Helse Møre og Romsdal 13.mai 2020

Johan Arnt Vatnan, leiar prosjektstyret



Optimalisering av forprosjektet

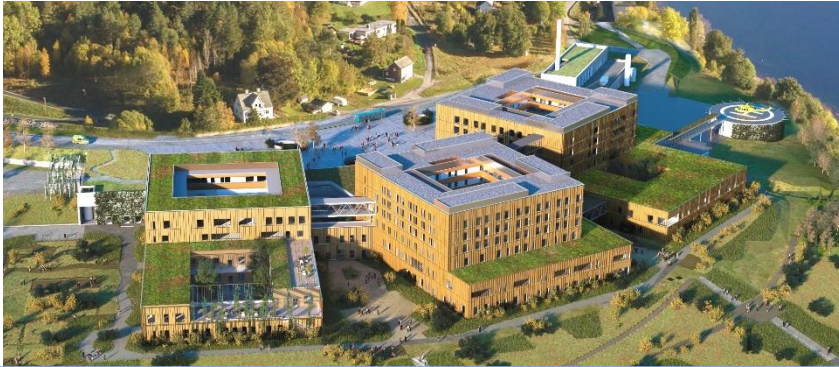

Nettoareal: 26 607 m²
(rom- og funksjonsprogram)

Bruttoareal: 72 000 m²



Nettoareal: 24 900 m²
(rom- og funksjonsprogram)

Bruttoareal: 53 350 m²

B/N: 2,14

Arbeid med funksjonsområda

- Alle funksjonar er plassert i bygningskroppen
- Har redusert nettoarealet utan å fjerne funksjonar eller kapasitetar
- Fokus på å løyse funksjonane optimalt i ny layout innanfor tids- og kostnadsramma
- Dei fleste områda er godt løyst
- Låg brutto/nettofaktor gir utfordringar da det er særskilt kompakt i enkelte område. Noko som gir mindre elastisitet og fleksibilitet i bygget




- Operasjonsområde under utvikling



- Poliklinikkområde under utvikling


Eksempel

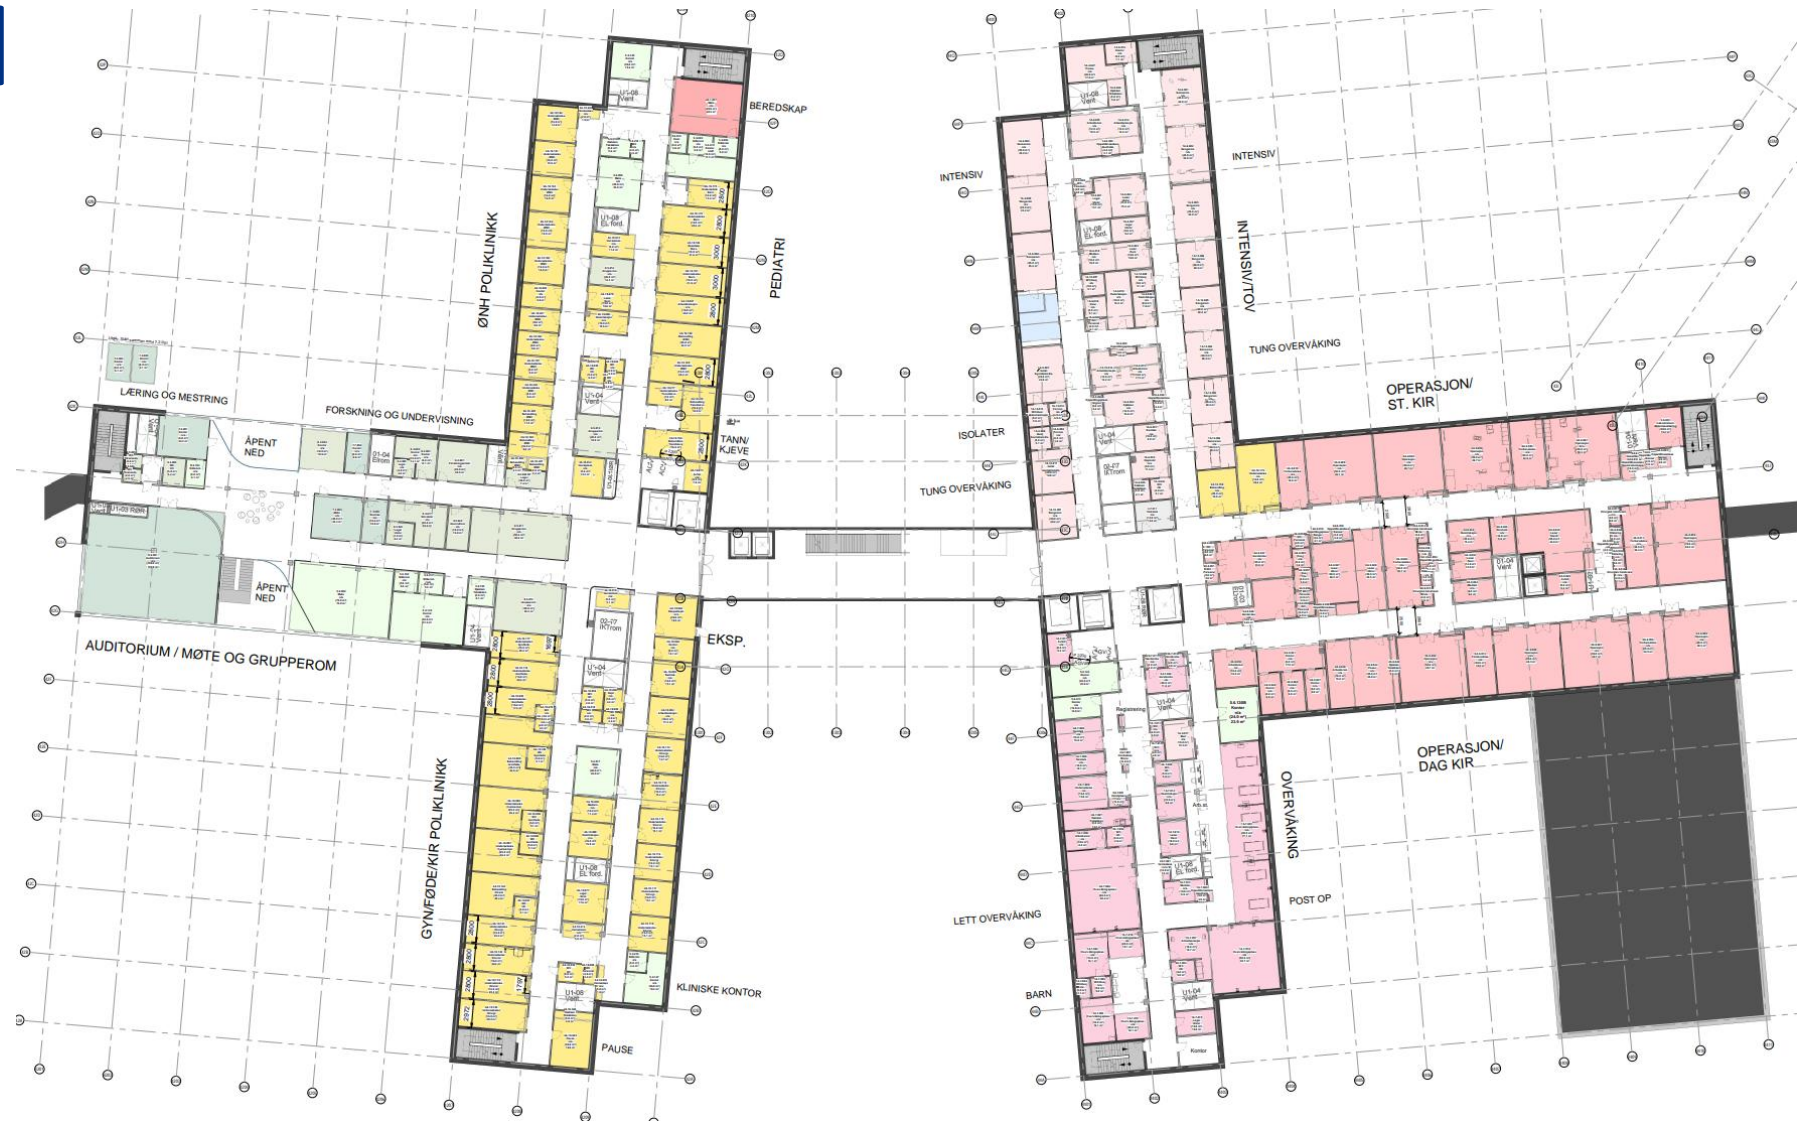

Eksempel



 HELSE MØRE OG ROMSDAL
Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

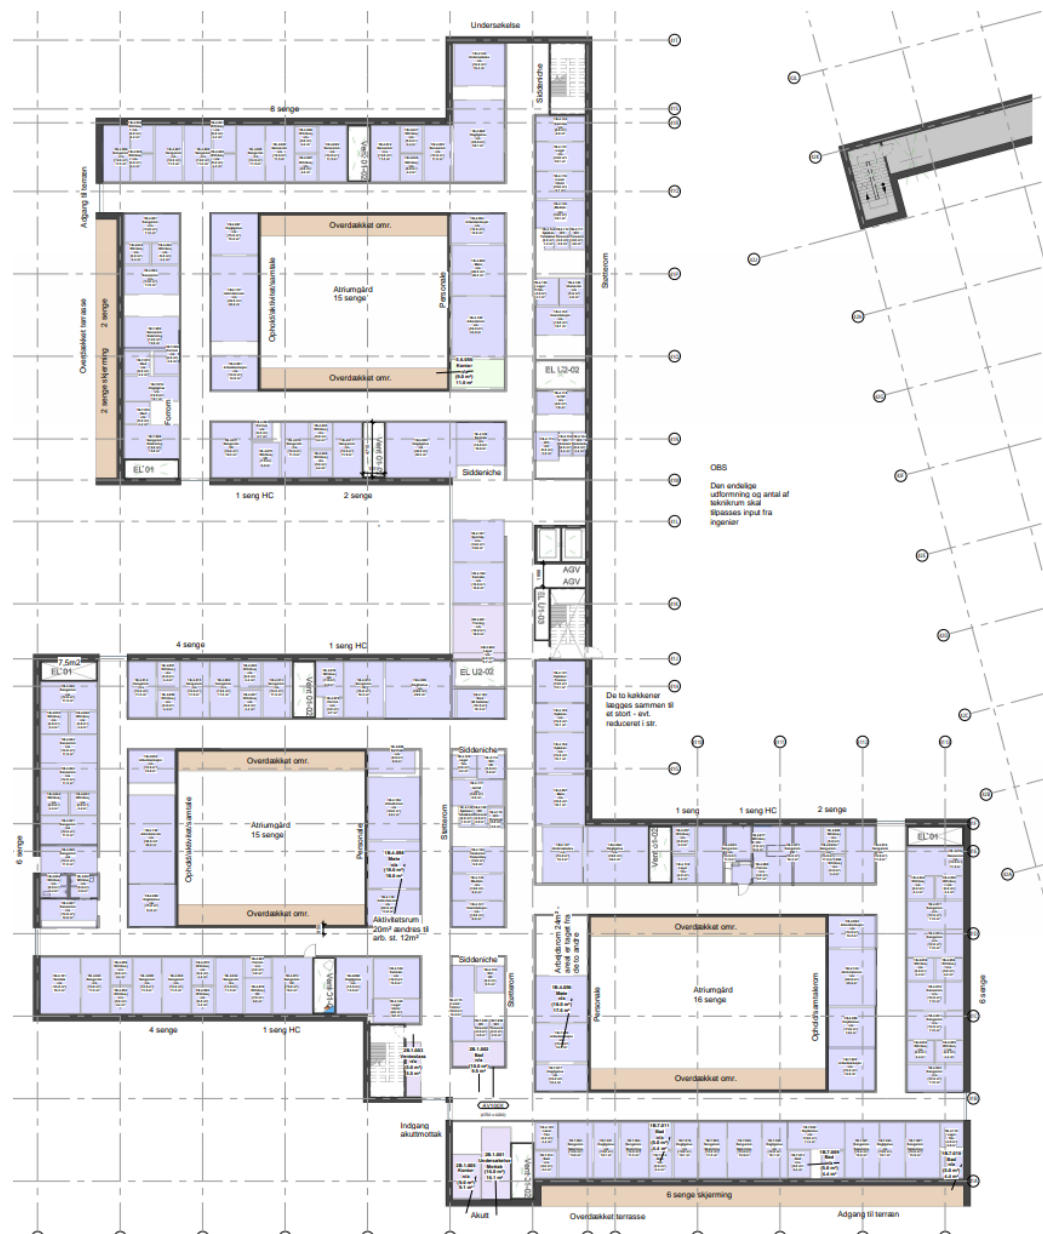


Medvergingsarbeidet

- Lite påverka av koranasituasjonen
- Plana for tilsettmedverking blir følgt
 - God oppslutning og deltaking
- Møte med alle funksjonsgrupper i veke 18
 - Vurdere oppfølgingsmøte i mai
- Møte med prosjektråd
- Nødvendige avklaringar og forankring blir gjennomført med gruppeleiarar, funksjonsgrupper, tillitsvalde og verneombod
- Møte også med brukarutvalet i vår



Andre aktiviteter på Hjelset

Etablering av to nye bruer på Hjelset

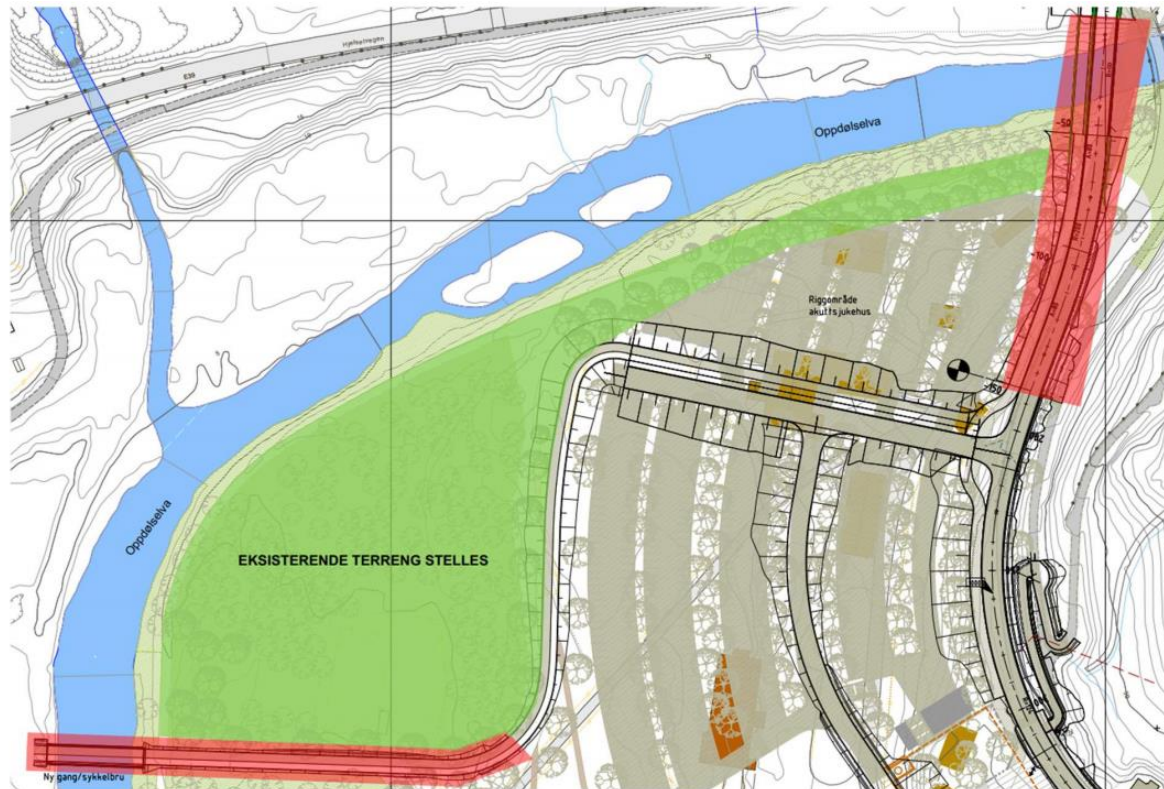

Figur 2: Illustrasjon av arbeidsomfang i Infrastruktur II. Veibro og Oppdølsveien er markert i rødt i øverste høyre hjørne, gang- og sykkelveibro er markert i rødt nede til venstre, mens det tilhørende arealet langs Oppdølselva er markert i grønt mellom de to broene.

- Har mottatte tilbud på bygging av:
 - ei vegbru med gang- og sykkelveg over Oppdølselva
 - ei gang- og sykkelvegbru over Oppdølselva mot Hjelset sentrum
- Ferdigstilling vinteren 2020/21

Samlar pasienttilbodet



- **Vil samle den psykiatriske drifta i B-paviljongen**
 - Enkel ombygging gjer det mogeleg å vidareføre pasienttilbodet som i dag
 - God løysing både for pasientar og tilsette
- **Vil rive A-paviljongen**
 - Legg til rette for eit riggområde i umiddelbar nærleik til byggeplassen

Tentativ framdriftsplan




Aktivitet	Tidspunkt
Prosjektutvikling og optimalisering	Okt. 19 - haust 2020
Byggestart	Haust 2020
Systematisk ferdigstilling av bygg • Teknisk prøvedrift • Klinisk prøvedrift	2023
Overlevering til HMR	2023
Full drift ved akuttsjukehuset	Våren 2024


Oppdatert prognose

Estimert oppdatert prognose

- Ein førebels usikkerheitsanalyse viser at estimert oppdatert prognose for prosjektet er: 4 793 MNOK
- Ein ny usikkerheitanalyse vil bli gjennomført i juni og resultatet blir lagt fram for styret 10.juni i samband med optimalisert forprosjekt.

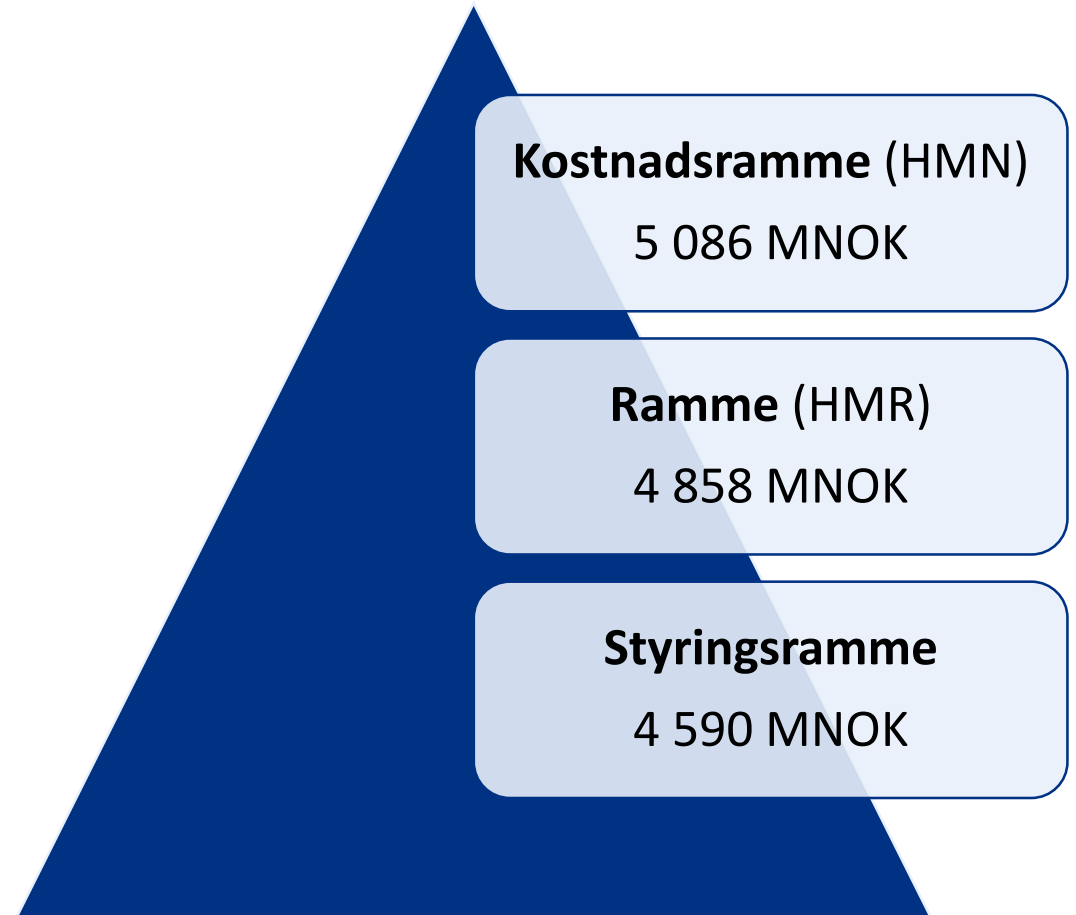

Vurderer trinnvis bestilling av gjennomføring

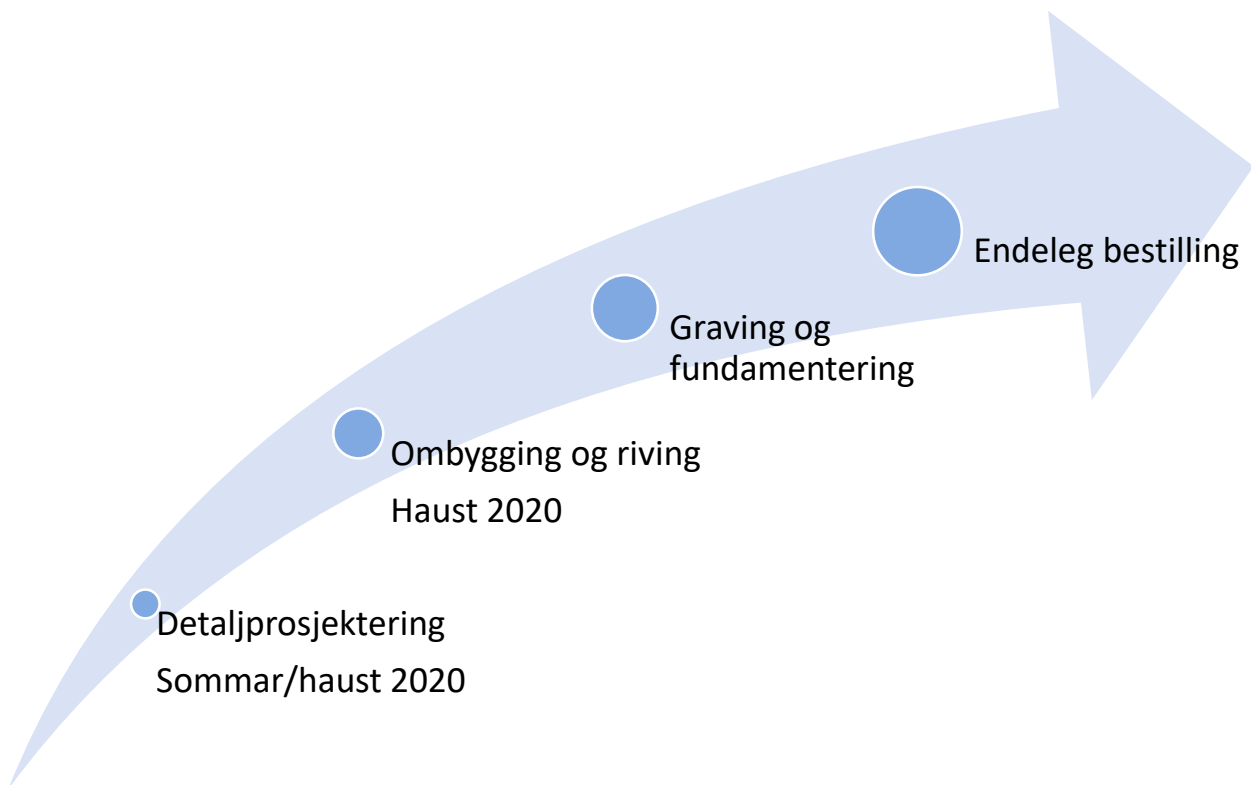

Vidare sakshandsaming

- **13.mai** – orientering til styret i Helse Møre og Romsdal
- **19.mai** – orientering til styret i Helse Midt-Norge
- **10.juni** – optimalisert forprosjekt leggas fram for styret i Helse Møre og Romsdal
- **18.juni** - orientering til styret i Helse Midt-Norge
