



HELSE MØRE OG ROMSDAL

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Status i funksjonsprosjektet Sjukehuset Nordmøre og Romsdal


Styremøte i Helse Møre og Romsdal 15.september 2020

Johan Arnt Vatnan, leiar av prosjektstyret

Funksjonsprosjektet pågår




Klargjer etasjar frå botn til topp

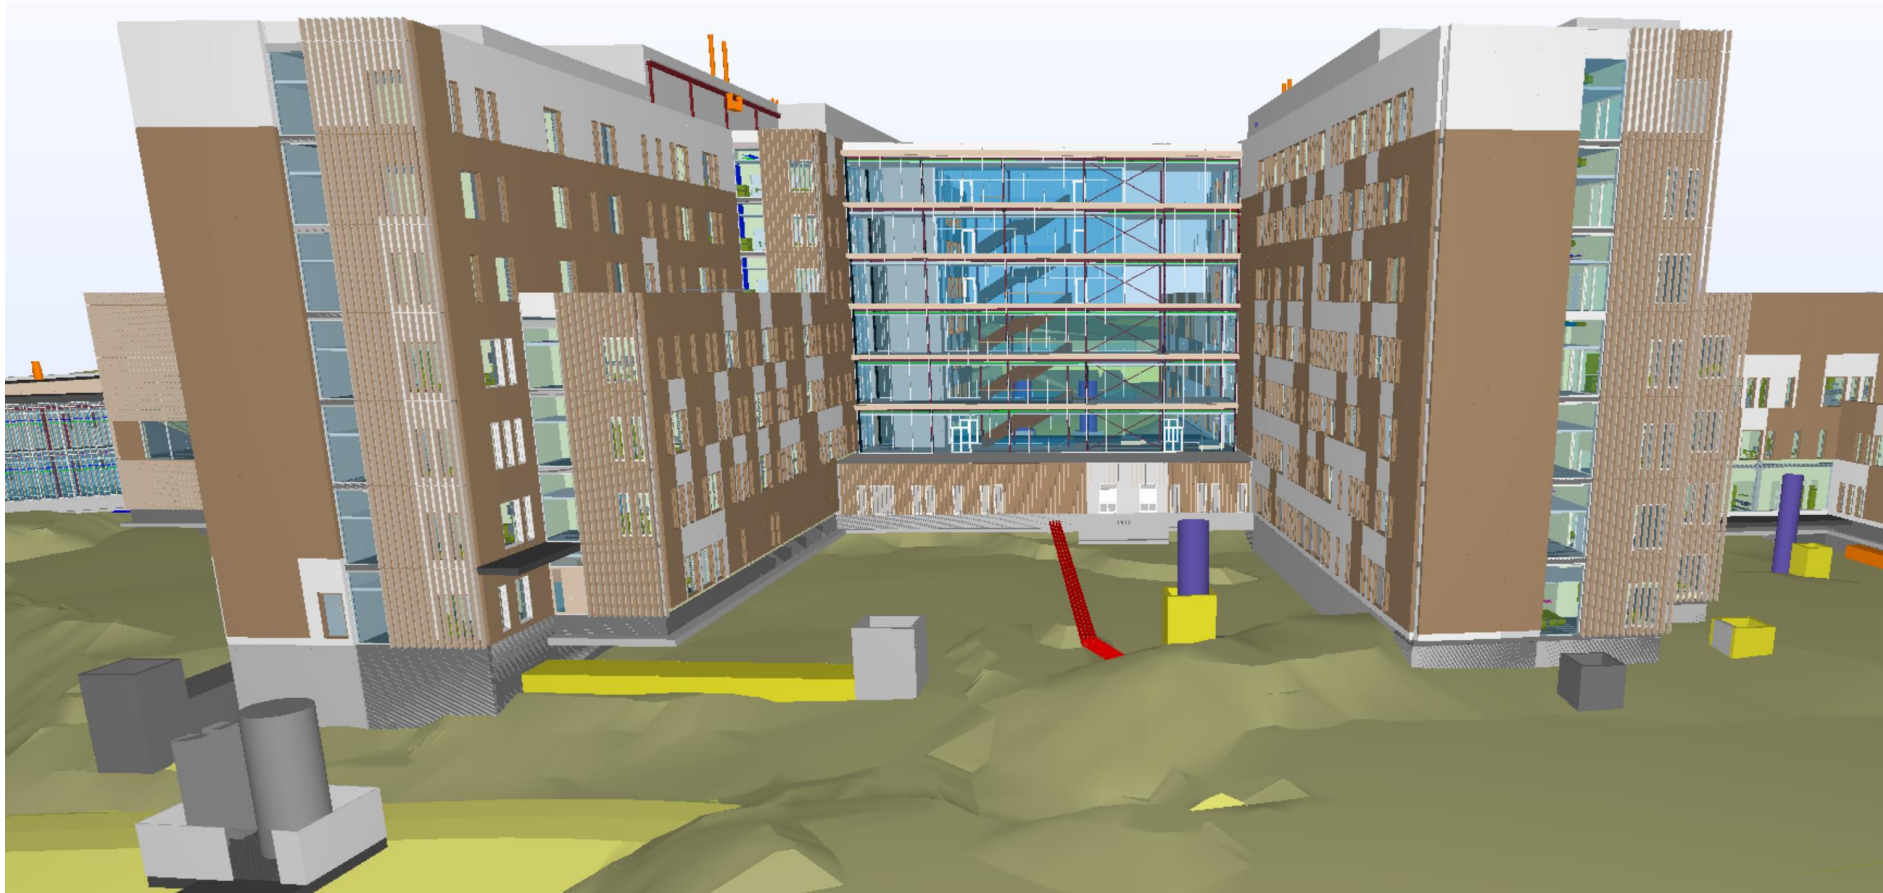

Illustrasjon frå funksjonsprosjektet


Akuttmottak og korttidspost er snart klar

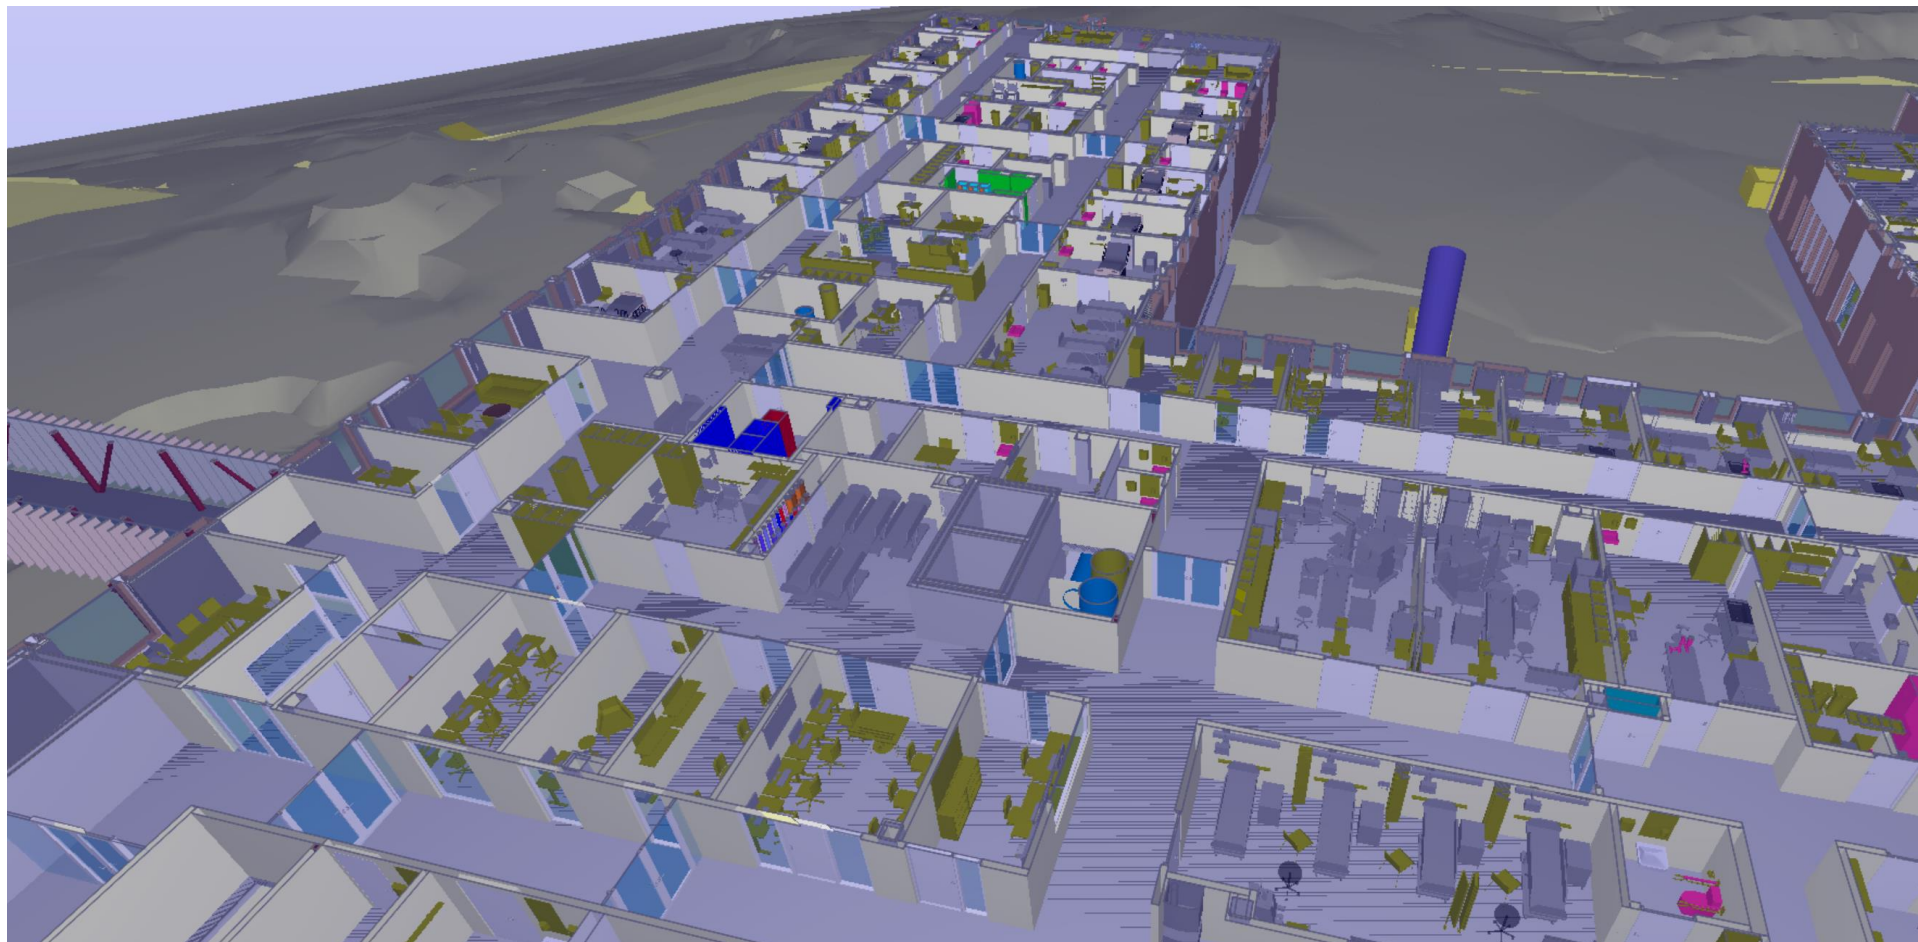

Illustrasjon frå funksjonsprosjektet


Oppgåver i funksjonsprosjektet

- Akuttsjukehuset blir vidareutvikla og kvalitetssikra:
 - Utteikning av alle rom
 - Plassering utstyr
 - «Skoeskemodellar» for ein stor del standardrom og enkeltrom
 - Val med tanke på materialbruk

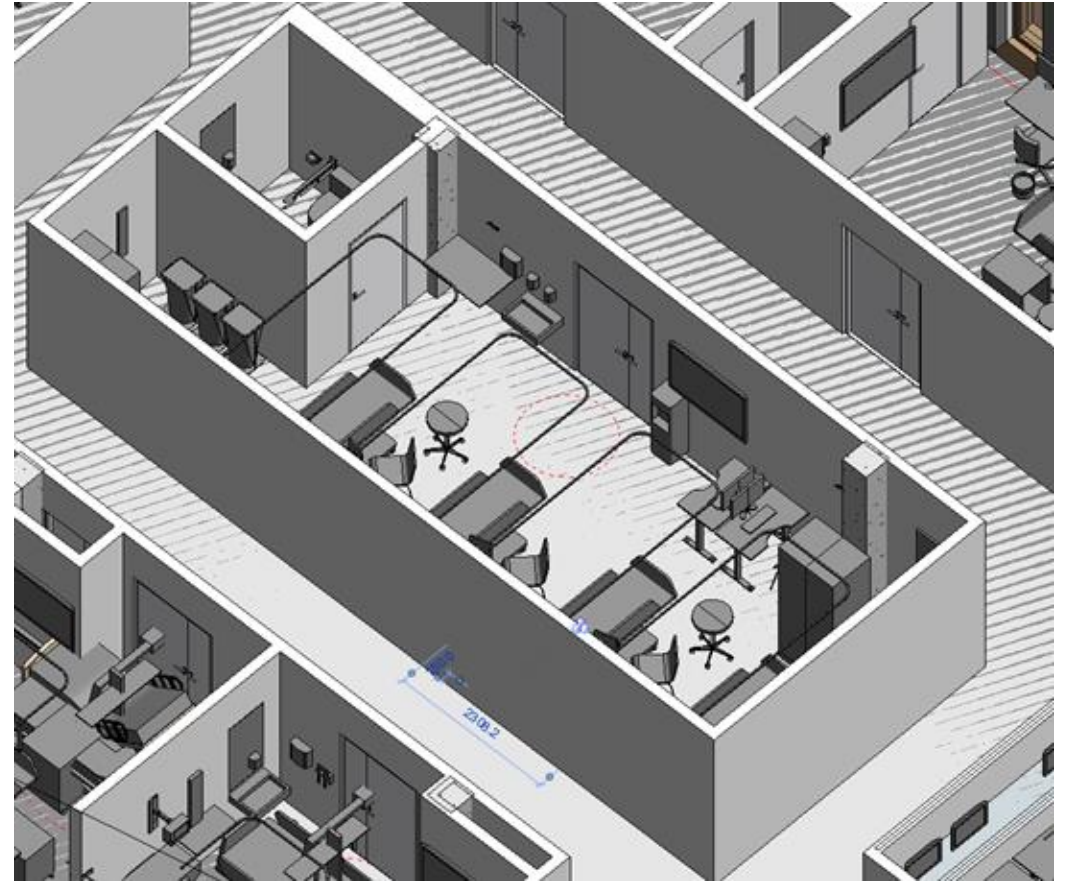

Illustrasjon frå funksjonsprosjektet

Sengeetasjar står for tur

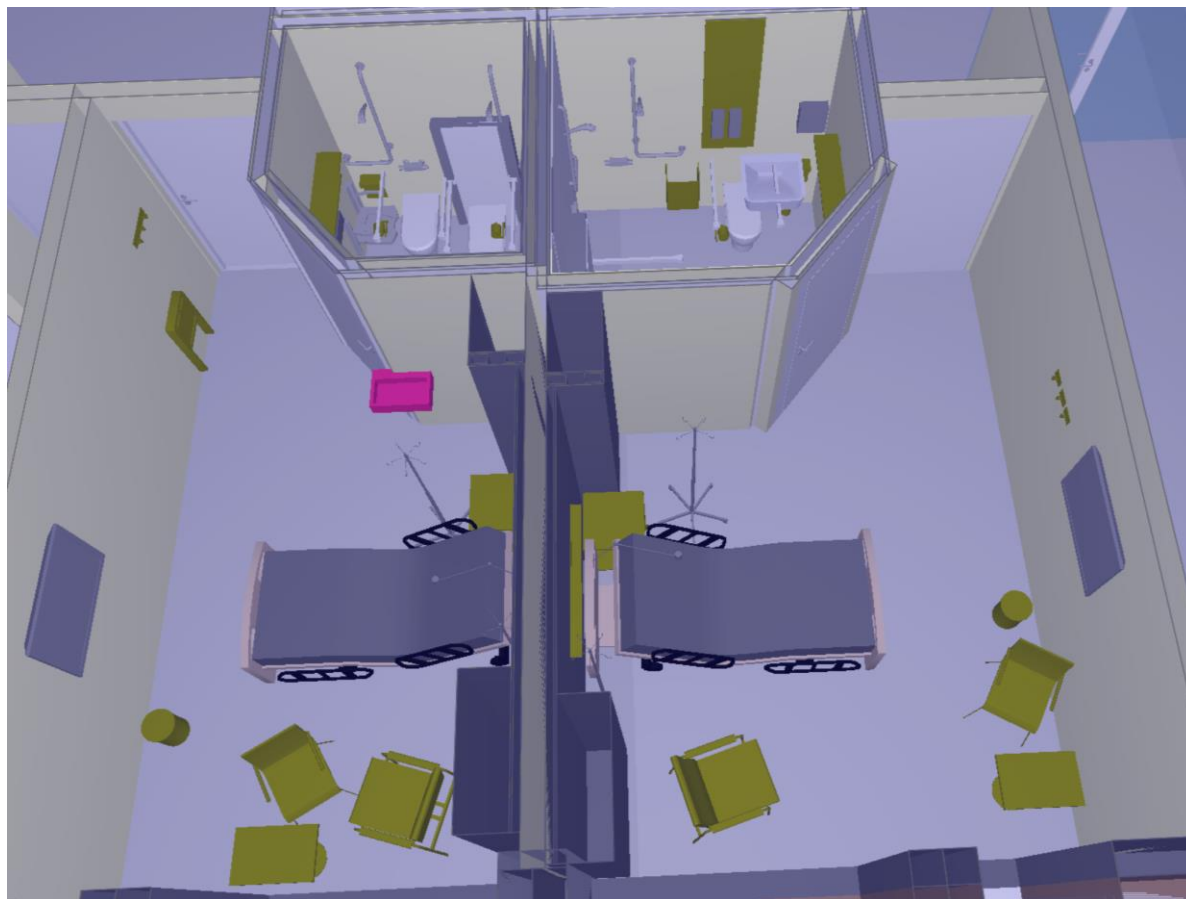

- Tilsette og brukarar bidreg med å kvalitetssikre og vidareutvikle funksjonsområda
- Funksjonsprosjektet blir avslutta i desember


Illustrasjon frå funksjonsprosjektet

Vidareutvikling av psykiatribygget



- Har jobba for å finne ein meir optimal løysing for psykiatribygget

- Har kome fram til ein ny bygningsmessig løysing som er betre både driftsmessig og økonomisk
- Betre for drifta på Hjelset i byggeperioden
- Kan truleg unngå å rive bygg før innflytting i SNR
- Unngår ombygging til midlertidige løysingar i eksisterande psykiatribygg

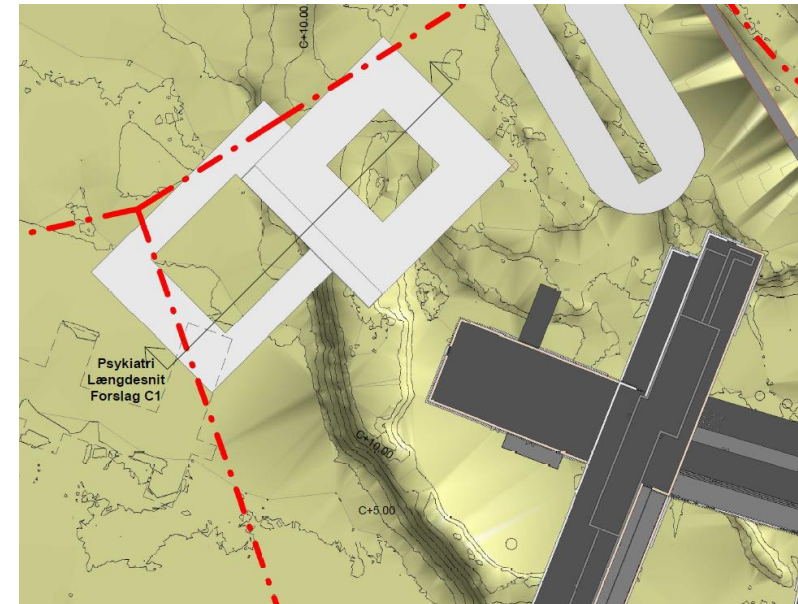

Arealutvikling så langt i funksjonsprosjektet



Optimalisert forprosjekt, juni

Funksjonsprosjektet, per. sept.

Bruttoareal

54 427 m²

55 100 m²

Nettoareal

24 899 m²

24 899 m²


Brutto/nettofaktor

2,19

2,21

Oppsummert om funksjonsprosjektet

- **Kjem til å levere på bestillinga for funksjonar og kapasitet**
 - Kliniske areal er tett og effektivt utnytta
 - Sjølv om programmerte rom vil få plass, blir det avgrensa fleksibilitet i bygget for framtidige endringar
- Uendra prognose på 4 793 MNOK mot ei styringsramme på 4590 MNOK (jan. 2020-kr.)
- Fokus på detaljprosjektering og risikoreduserande tiltak i kommande periode

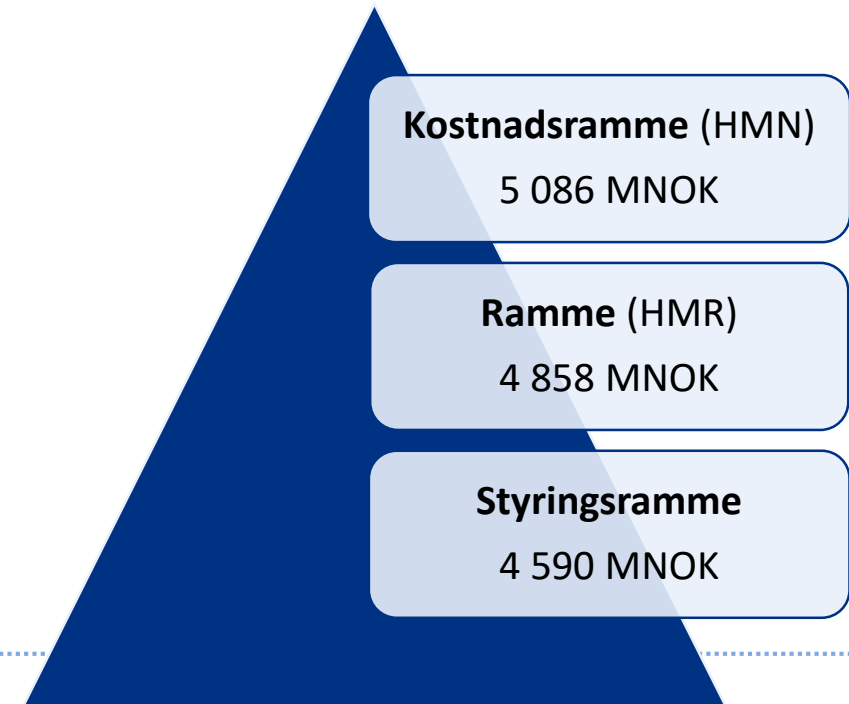

Rapport om nye Østfold sykehus Kalnes



- Har bedt Sykehusbygg om ein rapport som m.a. skal gjere greie for om SNR har planlagt med løysingar som Kalnes har fått utfordringar med
- Viktige skilnadar mellom prosjekta:

	Kalnes	SNR
Utnyttelsesgrad senger	90 % belegg	85 % belegg
Dimensjonering for elektiv drift	10 timer. 240 dagar årleg	8 timer. 230 dagar årleg
	Fekk auka sitt opptaksområde etter ferdigstilling	


Anskaffelsar i prosjektet hausten 2020

- Anskaffing av utstyr til produksjonskjøkken på Hjelset pågår
- 15.-16.september er det dialogkonferanse for analysehall laboratoriemedisin
 - Fire leverandører deltek og presentere sine løysingar
- Andre anskaffelsar som startar i haust er:
 - laboratorieutstyr
 - fastmontert utstyr operasjon
 - vaskedekontaminatorar



Veg- og brubygging på Hjelset

- Veidekke Entreprenør AS skal bygge to nye bruer på Hjelset, samt tilhørende veg
 - Har fått nødvendige godkjenningar for å kunne starte grunnarbeid
 - Arbeidet vil starte opp i sep./okt. og vil etter planen halde fram til mars 2021

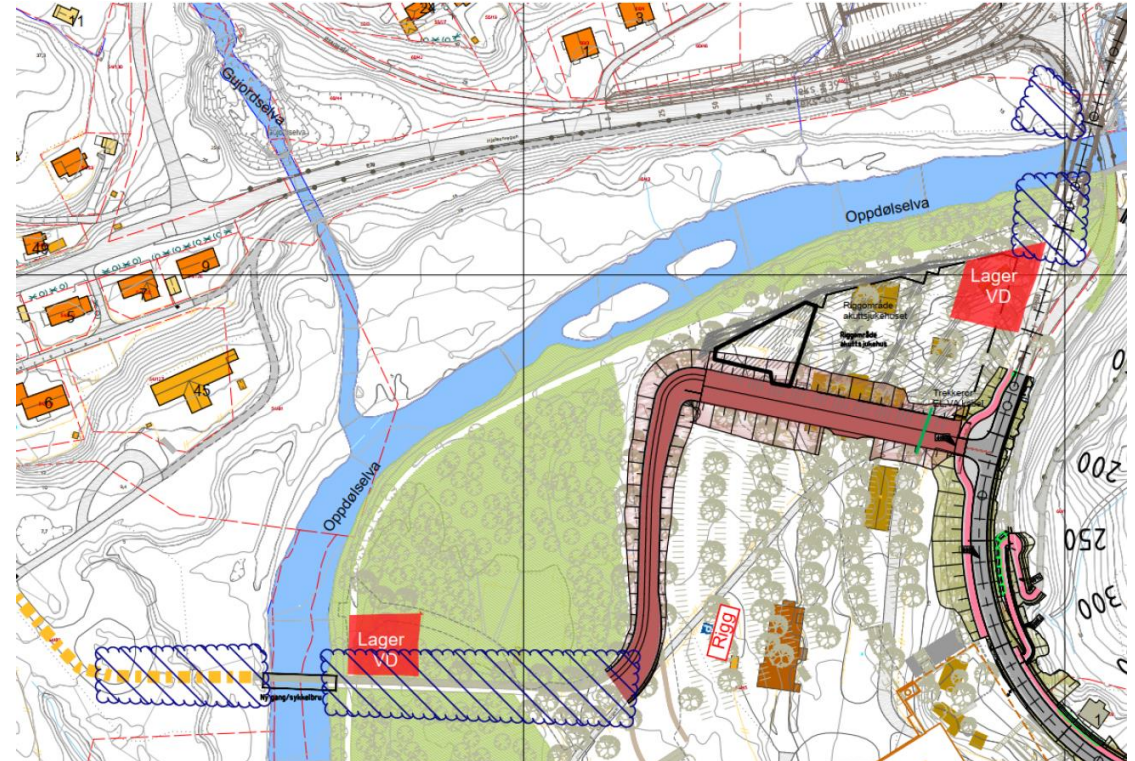

Tentativ framdriftsplan for akuttsjukehuset



Aktivitet	Tidspunkt
Funksjonsprosjekt	Juni 2020 – des. 2020
Detaljprosjektering	Juni 2020 - des. 2021
Byggestart	Des. 2020
Systematisk ferdigstilling av bygg • Teknisk prøvedrift • Klinisk prøvedrift	2023
Overlevering til HMR	2023
Full drift ved akuttsjukehuset	1. mai 2024

Oppgradering av SNR-arealet i Kristiansund



- Prosjektet vil vurdere ulike tidspunkt for gjennomføring av bygningsmessige endringer av spesialisthelsetenesta sine areal.
- Vil belyse konsekvensar for prosjektkostnad- og framdrift, samt den kliniske drifta i HMR.
- Prosjektstyret vil kome med ei anbefaling til adm. dir. om korleis ombyggingsarbeidet bør gjennomførast.

Vedtak frå juni:

«Styret i HMR ber om å få framlagt ei sak om vidareutviklinga av spesialisthelsetenestetilbodet i DMS-prosjektet, som inkluderer ei framdriftsplan for arbeidet med oppgradering av SNR-areala i Kristiansund innan mai 2021».

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

